

本郷地区 土地造成事業（1期）土地造成工事



J Vから（近況報告）

本郷造成工事は現在、伐採工事の最盛期です。 県道進入路奥からの伐採材搬出は一旦中断しますが、山の奥の見えない部分については、伐採はかなり進捗しております。 伐採材搬出の再開は、5月中旬からになります。 それ以降は継続的に搬出の予定です。 今後伐採は、夏までに一部を残し終了したいと思っておりますが、搬出については、秋頃までかかる見込みです。

また5月からは、盛土工事を少しずつ開始していきます。 盛土工事とは、掘削した土で沢を埋めていく工事です。 そのため、過日試験施工を致しました。 工事に際しては、その試験施工の結果に基づき、適正に管理し実施していきます。

J Vとしても、皆様のご期待に応えられるよう、立派な産業団地に仕上げていきますので、よろしくお願い致します。

工事現況



表ページの写真の反対側から撮影しています(東側から空港方面を望む)



表ページの写真に写っている重機です


この奥も伐採しています

※お願い

用地内は、奥の方まで伐採が進んでいます。 用地への進入路(3か所)には「立入禁止」看板を掲示しております。 くれぐれも立ち入らないよう、お願いします。

ICT技術紹介

※ICT技術：(Information and Communication Technology) 情報通信技術

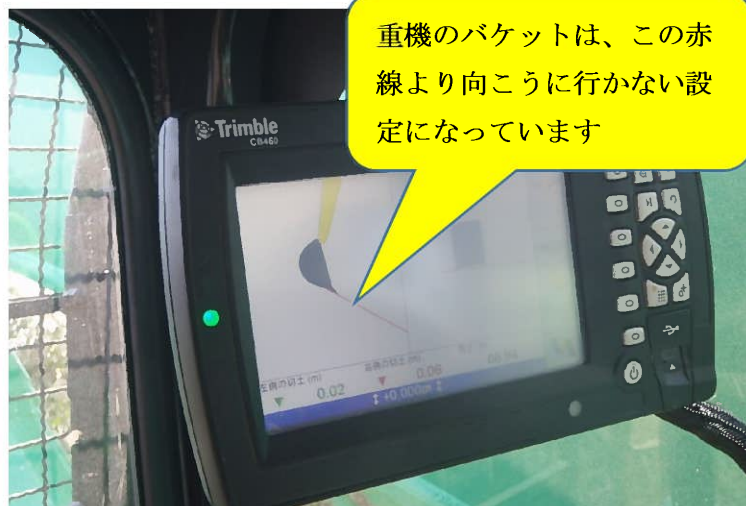

重機のバケットは、この赤線より向こうに行かない設定になっています

※大きな重機(1.4m³バックホウ)の羽先が、運転席のモニターで正確に表示されます。左写真のように、事前に丁張を設置し、モニター画像と一致することを確認してから掘削を開始します。

ホームページを開発しています

以下のURLから見られます。「本郷造成」等のキーワードで検索してもヒットします。

<http://www.asahi-net.or.jp/~by5t-asn/index.html>
